

Duna Régió Stratégia Projektfinanszírozási Konferencia
Budapest, 2015. március 26.

TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOKKAL VALÓ FENNTARTHATÓ GAZDÁLKODÁS A TISZA-TÚR KÖZÉBEN

Pesel Antal
gazdasági igazgatóhelyettes

Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

A projekt alapvető információi



A projekt célja

- Vízkészlet gazdálkodás javítása, ökológiailag fenntartható vízhasználat, az árvíz mértékének csökkentése
- Vízkészlet ökológiai állapotának felmérése, közös intézkedési program kidolgozása a vízminőség javítására, vizek védelmére
- A térség mezőgazdasági tevékenységének megtartása
- A biológiai sokféleség megőrzésének támogatása
- Helyi szervezetekkel együttműködve az előző célok kis léptékű gyakorlattá tétele

Projekt partnerek

- *Tiszai Vízgyűjtő-gazdálkodási Igazgatóság (UA), vezető partner*
- Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (HU)
- Szamos-Tisza Vízügyi Hivatal (RO)
- Nagyszőlősi Járási Adminisztráció (UA)
- Nagyszőlősi Járásközi Vízgazdálkodási Hivatal (UA)
- Ökoszféra Regionális Ifjúsági Ökológiai Szervezet (UA)
- Ukrán Állami Talajvédelmi Intézet Kárpátalja (UA)

Társfinanszírozás aránya: 10% minden partnernél

A projekt időtartama: 2012.11.01 – (2014.10.31.) – 2015.08.31

A projekt alapvető információi




ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program pályázatai a FETIVIZIG részvételével, 2007-2013. években

| Sor sz. | Címe | Teljes költsége eFt |
|---------|--|---------------------|
| 1. | <i>A közös magyar-ukrán távmérő rendszer továbbfejlesztése</i> | 251.570 |
| 2. | A magyar és ukrán Felső-Tiszai árvízvédelmi fejlesztési programok, integrált előrejelző rendszer térinformatikával | 284.490 |
| 3. | Az árvízi készülség növelése a határon átnyúló Beregi belvízrendszer területén, a Csaronda-Latorca vízgyűjtőjén | 353.217 |
| 4. | <i>Közös magyar-ukrán komplex síkvidéki árapasztási és ártérrevitalizációs fejlesztési program a Felső-Tisza Visk-Vásárosnamény szakaszára</i> | 470.473 |
| 5. | <i>A természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás a Tisza-Túr folyók találkozásánál</i> | 377.243 |

befejezett
folyamatban lévő
magyar vezető partner


A projekt alapvető információi

A projektterület, várt eredmények

- A Túr folyó rekonstrukciójának első üteme, megvalósíthatósági tanulmány a Batár patak vízgyűjtő rendszerének felújítására (UA) 
- A Palád-Csécsei öblözet rekonstrukciójára vonatkozó tervek (HU)
- Hidrometriai, vízminőség ellenőrző állomások rekonstrukciója a Túr folyón (RO)
- Ökológiai állapotfelmérés mindhárom ország területén, közös intézkedési program 
- Agrotechnikai tevékenységek fenntartható gyakorlatának kidolgozása és népszerűsítése a gazdálkodók körében (közös)
- Kulcsfontosságú biodiverzitás helyek azonosítása, tudatosítása (közös) 

A pályázat folyamata

- A Batár-Palád vízrendszer komplex rekonstrukciós igényének felmerülése
- Határon átnyúló megoldás lehet hatékony
- Konzorcium vezető a projekt költségvetésében legnagyobb súlyú partner, a tagokat is ő szervezte
- Az adott műszaki tartalommal a magyar fél csak ide pályázott (90%+10% támogatás)
- FETIVIZIG saját apparátussal készíti a pályazatait
- A kiíró szervvel az egyeztetés folyamatos volt
- A pályázat benyújtása (2010.05.26.) és elindulása (2012.11.01.) között 29 hónap telt el.

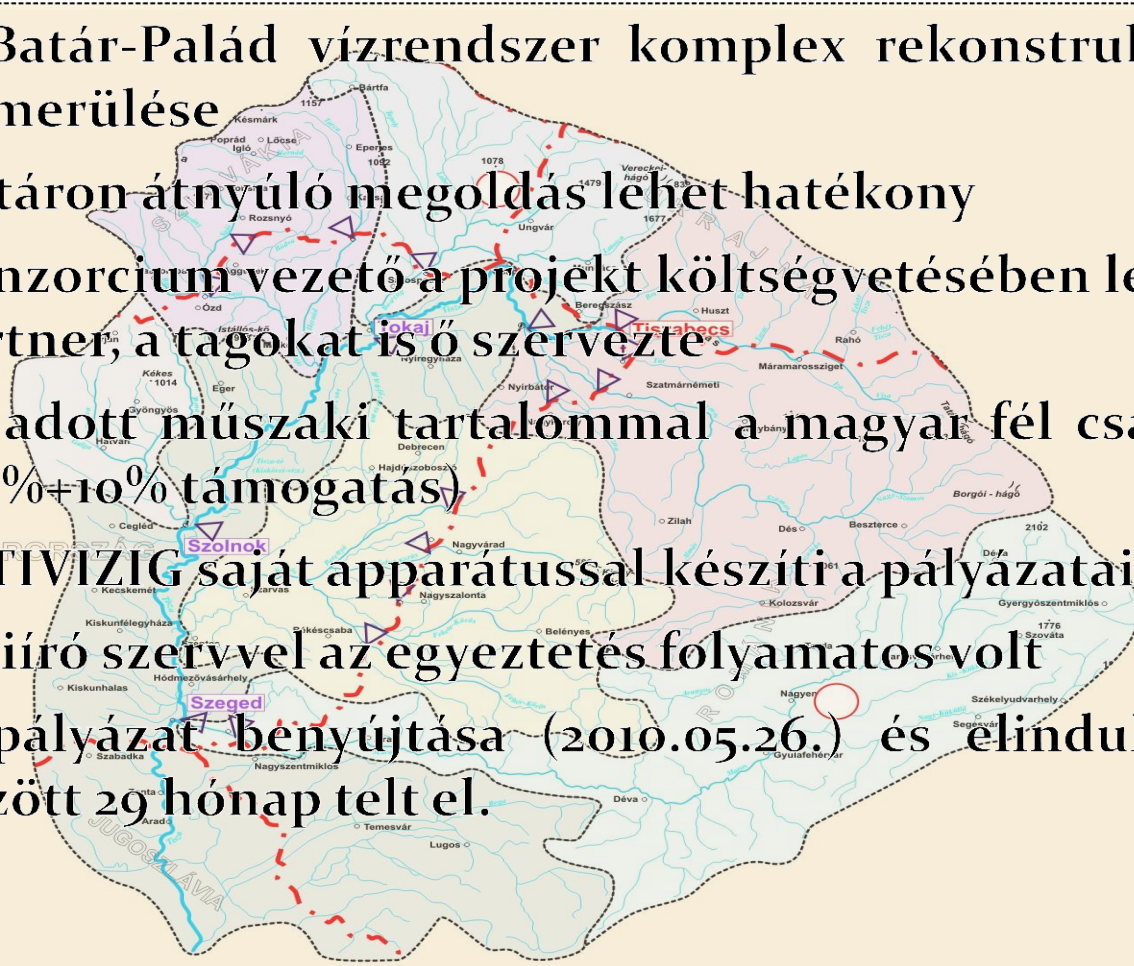

Indikátorok

5 tevékenységre 34 db. Példák:

| Indikátor | Egység | Kiindulási érték | Célérték |
|---|--------|------------------|----------|
| Közös tervezési tevékenység | db | 0 | 3 |
| Beszerzett automata állomások száma | db | 0 | 5 |
| Árvíztől védett lakosok száma | fő | 0 | 6200 |
| Fejlesztett és tesztelt módszerek száma | db | 2 | 5 |
| Bevont gazdálkodók száma | fő | 0 | 60 |
| Határérték feletti vízminták aránya | % | 100 | 75 |
| Gyűjtött adatok a biodiverzitásról | db | 22 | 60 |

A projekt végrehajtása

- Szerződés módosítás: 2014.10.31-ről 2015.08.31-re
 - Ok: finanszírozási gondok
 - Projekt partner csere (UA), kisebb tartalom módosítás
- Jó együttműködés a partnerekkel
- Jelentéstételi kötelezettség:
 - hazai közreműködő szervezet (VÁTI/Széchenyi Programiroda)
 - vezető partner
 - Közös Irányító Hatóság
 - Az ukrán auditor eltérő követelményei
- Befejezés nehézségei az ukrán partnerek társfinanszírozási problémái miatt (forrás, deviza átváltás, krízis helyzet)
- A várt eredmények realizálódnak.
- Zárás: vezető partner és közös irányító hatóság egyeztetése szerint
- A projekt lehetséges utóélete: elkészült tervek kivitelezése
 - mezőgazdasági, biodiverzitási jó gyakorlat folytatása

A projekt végrehajtása

Finanszírozás

| Megnevezés | Közösségi támogatás (ezer €) | Nemzeti forrás (ezer €) | Teljes költség (ezer €) | Részarány % |
|---------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| Vezető partner (UA) | 778 | 86 | 864 | 71,8 |
| Partner 1 (HU) | 125 | 14 | 139 | 11,6 |
| Partner 2 (RO) | 89 | 10 | 99 | 8,2 |
| Partner 3 (UA) | 33 | 4 | 37 | 3,1 |
| Partner 4 (UA) | 7 | 1 | 8 | 0,7 |
| Partner 5 (UA) | 25 | 3 | 28 | 2,3 |
| Partner 6 (UA) | 25 | 3 | 28 | 2,3 |
| Összesen: | 1.083 | 120 | 1.203 | 100,0 |

Előleg: 12 hónapos időszakonként a becsült költség 80%-a maximum a teljes költség 90%-a.

Elszámolás: előlegek 70%-os felhasználásánál záró jelentéssel egyidejűleg

Tapasztalatok, javaslatok

- Vízgazdálkodási, árvízvédelmi, vízminőségi szempontból a határ menti régiók összehangolt fejlesztése nélkülözhetetlen
- Ukrajna helyzete jelenleg és várhatóan a következő években is adekvát pályázati megoldásokat igényel
- Célszerű ha magyar partner a projektvezető
- Megfontolandó az ukrán partner(ek) önerő biztosításának mellőzése
- Az ellenőrzési rendszert egyszerűsíteni és egységessé tenni
- A közvetlen szállítói kifizetés a kedvezményezettek számára kedvezőbb lehet

www.fetivizig.hu
pesela@fetivizig.hu

Köszönöm a
figyelmet!
